

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

ปูนสำหรับเทพื้นปรับ
ระดับแบบผสมเอง



คอนกรีตเทพื้นปรับระดับแบบ
ผสมเสร็จ



ปูนกาวปูหินถนน




รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 21/12/66



ทำการปิดกั้นพื้นที่ก่อน
เริ่มงาน

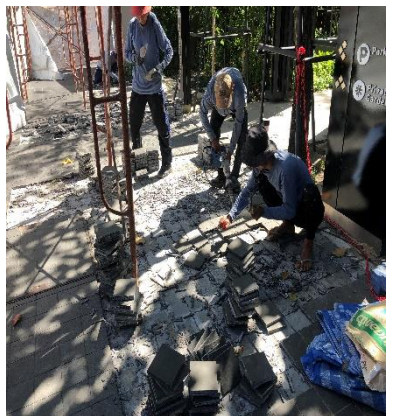


ทำการสกัดหินปูพื้นถนน
ออก

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 22/12/66

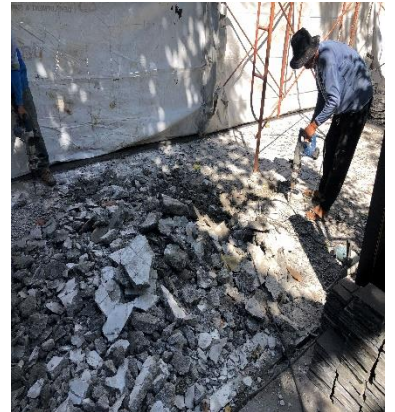

ทำการสกัดปูนขุยหน่อออก
และเก็บเศษปูน




ทำการสกัดปูนขุยหน่อออก
และเก็บเศษปูน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 23/12/66

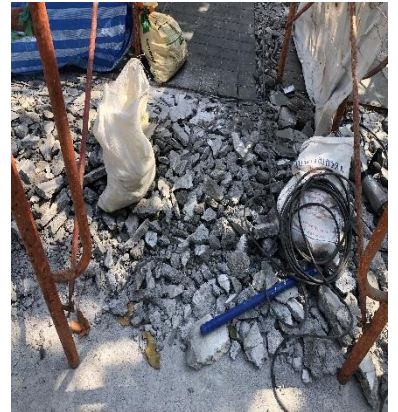

ทำการสกัดปูนขุยหน่อออก
และเก็บเศษปูน



ทำการสกัดปูนขุยหน่อออก
และเก็บเศษปูน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 25/12/66



ทำการเคาะเศษยาแนว
ออกจากหิน




ทำการทำความสะอาด



ทำการลงน้ำยาสมานคอก
ริตและเทปูนปรับพื้น



ทำการลงน้ำยาสมานคอก
ริตและเทปูนปรับพื้น

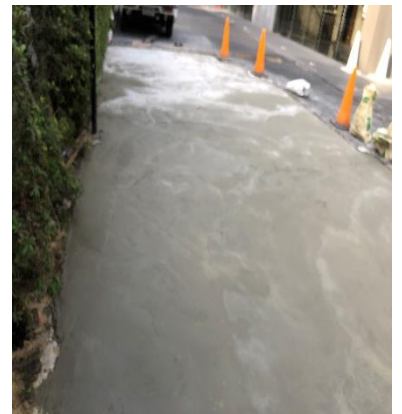


รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 26/12/66



ทำการปูหินถนน

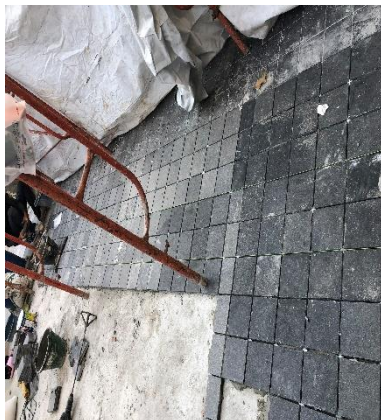


ทำการปูหินถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 26/12/66

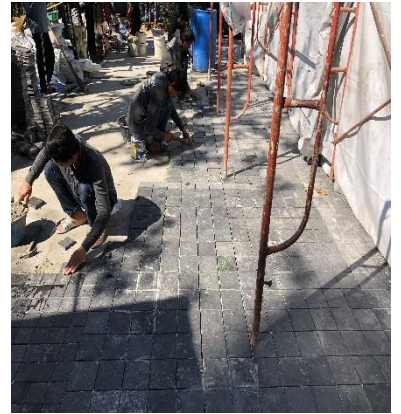

ทำการปูหินถนน



ทำการปูหินถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 27/12/66



ทำการปูหินถนน



ทำการปูหินถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 28/12/66



ทำการปูหินถนน




ทำการปูหินถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 29/12/66

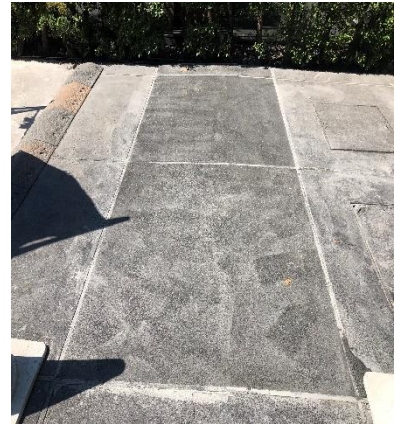

ทำการติดตั้งพื้นทรายล้าง





ทำการปูหินถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 30/12/66

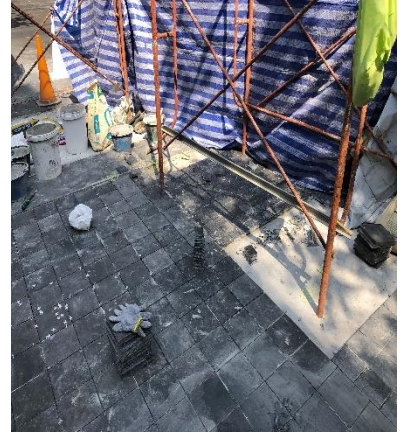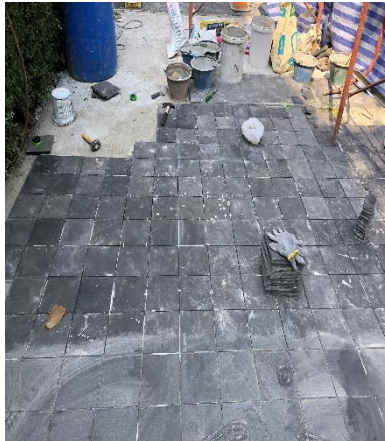

ทำการปูหินถนน



ทำการปูหินถนน


รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 03/01/67



ทำการยาแนวหินถนน

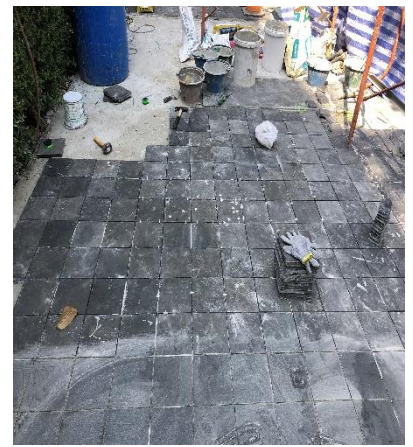

ทำการปูหินถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 04/01/67



ทำการยาแนวหินถนน
ฝั่งสวนย่อม

ทำการรื้อหินถนนฝั่ง
ทางเข้า



ทำการรื้อหินถนนฝั่ง
ทางเข้า

ทำการสกัดปูนขุยหนูนฝั่ง
ทางเข้า

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก


จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 05/01/67



ทำการเก็บเศษปูนออก
และทำความสะอาดฝั่ง
ทางเข้าเลนซ้าย

ทำการลงนํ้ายาสมาน
คอนกรีตฝั่งทางเข้าเลน
ซ้าย

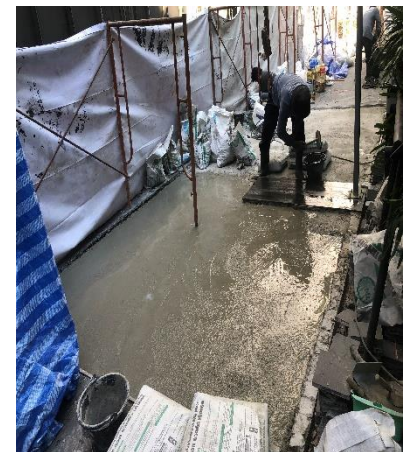

ทำการเทคอนกรีตปรับ
ระดับฝั่งทางเข้าเลนซ้าย

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 6/01/67



สกัดปูนขุยหนุออก



สกัดปูนขุยหนุออก



รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 7/01/67



สกัดปูนขุยหนุออก

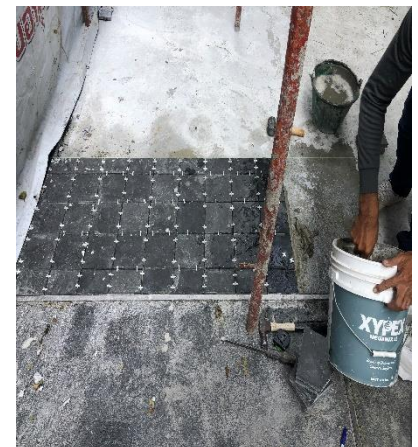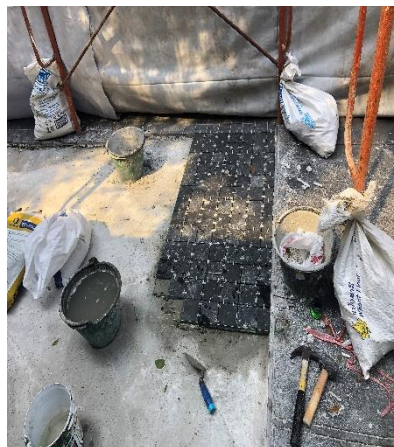

ทำการปูหินถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 8/01/67



เคาะปูนยาแนวออกจาก
หินที่สกัดออก

เก็บเศษปูนและทำความสะอาด
สะอาด



เก็บเศษปูนและทำความสะอาด
สะอาด

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 9/01/67



เทพื้นปรับระดับพื้นถนน




เทพื้นปรับระดับพื้นถนน


รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 10/01/67

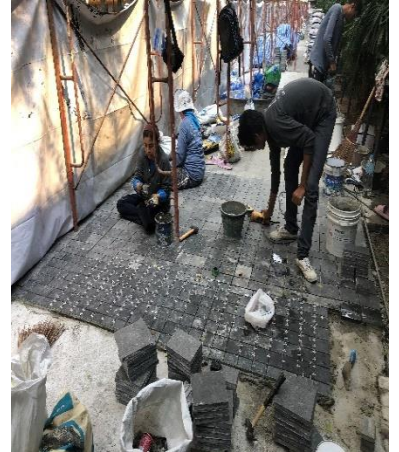

ปูหินถนน

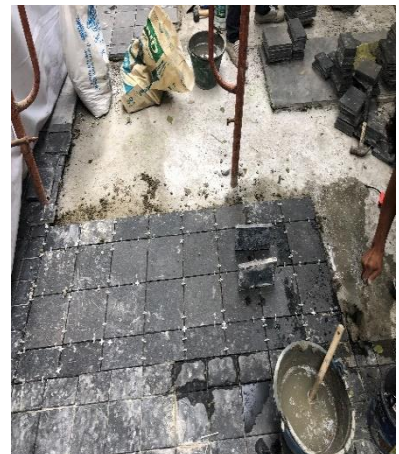


ปูหินถนน


รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 11/01/67

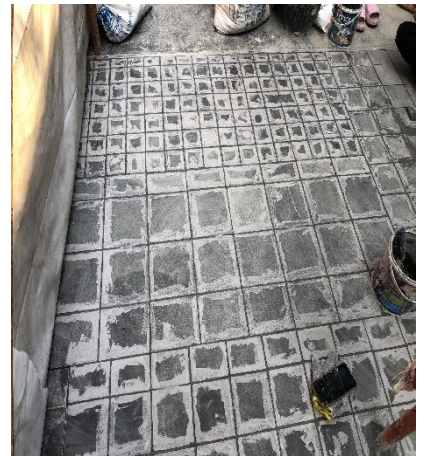

ยาแนวหินถนน

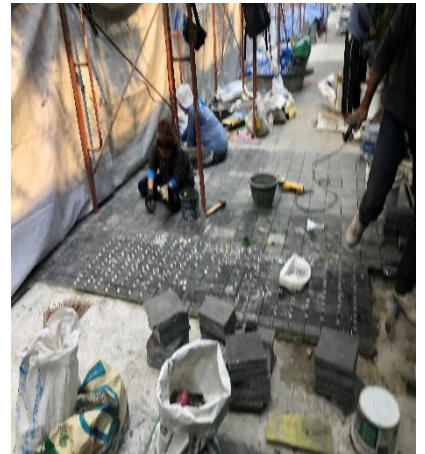


ยาแนวหินถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 12/01/67

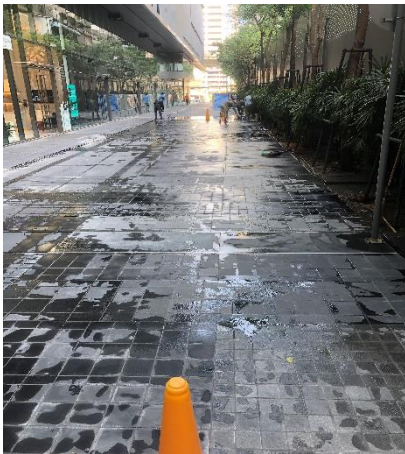

ย้ายของและล้างถนนหลัง
ปูหินจบ

ปูหินแผ่นพหุ

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 13/01/67



สกัดหินออก




ยาแนวหินถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 14/01/67

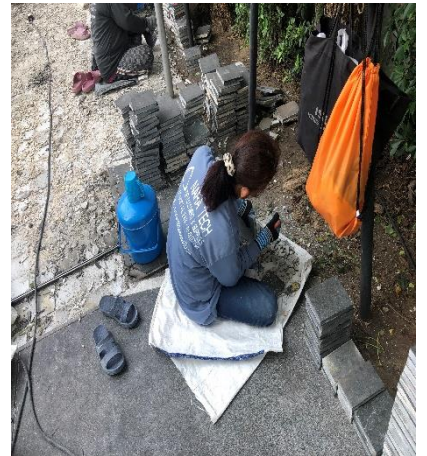

ยาแนวหินถนน



ปูหินแบบใหญ่พื้นถนน


รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 7 คน

วันที่ 15/01/67



ทำความสะอาดเตรียมเท
พื้นประบระดับ

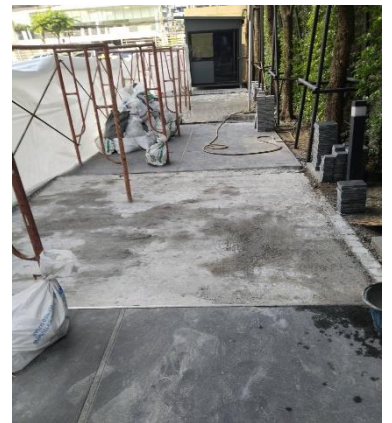

ทำความสะอาดเตรียมเท
พื้นประบระดับ

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 7 คน

วันที่ 16/01/67



เทปูนปรับระดับพื้นถนน




เทปูนปรับระดับพื้นถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 7คน

วันที่ 17/01/67

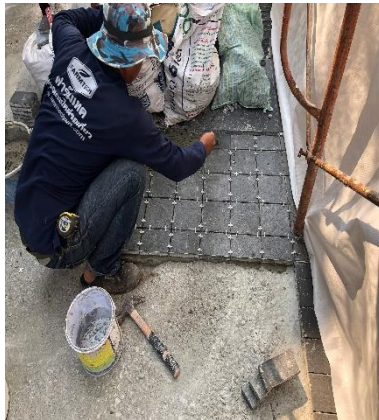

ปูหินพื้นถนน



ปูหินพื้นถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10คน

วันที่ 19/01/67



ปูหินพื้นถนน




ปูหินพื้นถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 7คน

วันที่ 20/01/67

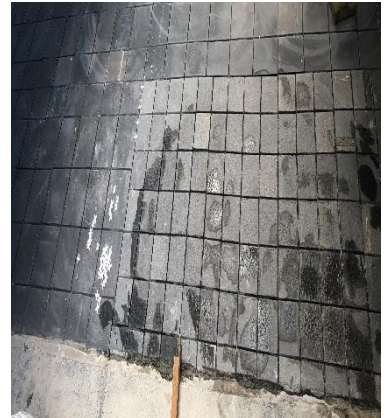


ยาแนวพื้นหินที่จบแล้ว



รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 7 คน

วันที่ 21/01/67

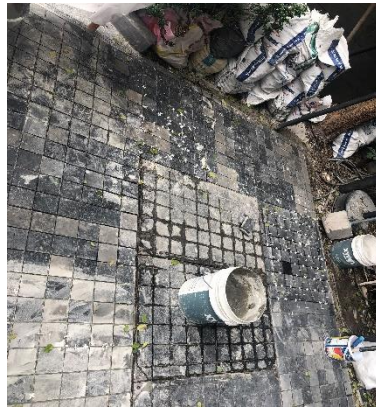

ปูหินพื้นถนน



รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 7 คน

วันที่ 24/01/67





ทำความสะอาดพื้นที่ที่ปู
กระเบื้องเสร็จแล้ว



ทำการเก็บและย้าย
อุปกรณ์และคืนพื้นที่
ส่วนกลาง



ทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อรื้อ
ถนน

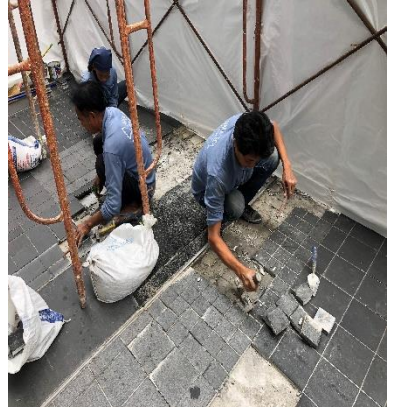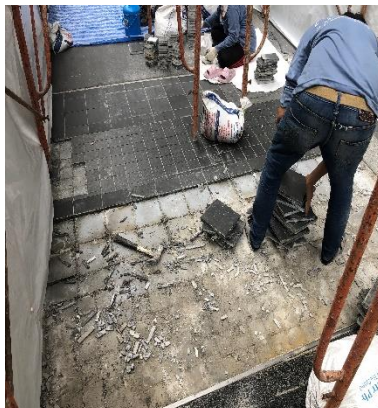

ทำการสกัดหินปูพื้นถนน
ออก


รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 25/01/67



ทำการสกัดปูนขุยหน่อออก
เพื่อเทปูนปรับระดับ

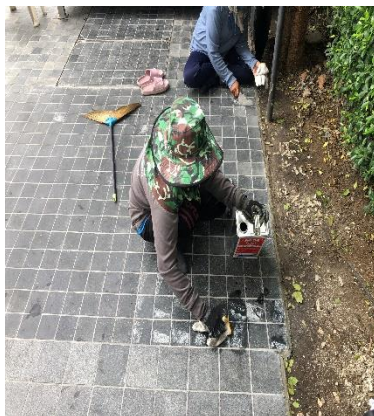

ทำการเก็บเศษปูนออกจากพื้นที่

ทำการล้างเส้นจราจรออก

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 26/01/67



ลงน้ำยาสมานคอนกรีต
ก่อนเทปูนปรับระดับ

รถปูนเข้ามาเทปูนรับ
ระดับพื้นถนน



ทำการเทคอนกรีตปรับพื้นถนน

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 27/01/67



ทำการปูหินถนน



ทำการปูหินถนน


รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 8 คน

วันที่ 28/01/67



ทำการปูหินถนน

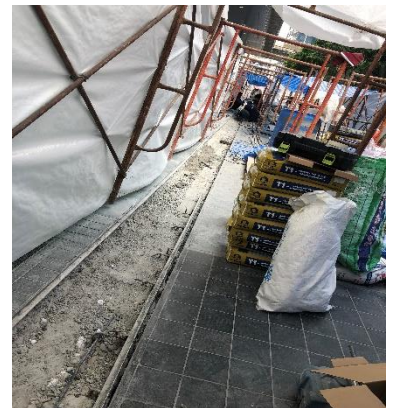

สกัดพื้นฟุตบาทออก


รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 29/01/67



เจาะพื้นเพื่อเสียบเหล็ก

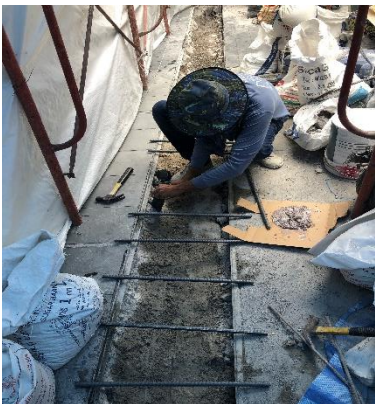

เสียบเหล็กและผูกเหล็ก

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 30/01/67



เสียบเหล็กและผูกเหล็ก



เสียบเหล็กและผูกเหล็ก

รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 31/01/67




เข้าแบบไม้เทพื้นฟุตบอลบาท



รายงานการปรับปรุงถนน เดอะแบงค็อก

จำนวนพนักงาน 10 คน

วันที่ 1/2/67

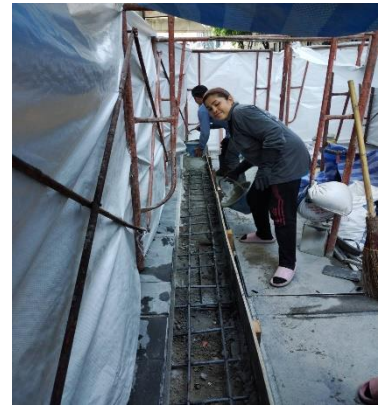

เทปูนฟุตบอลบาท



เทปูนฟุตบอลบาท
